Team plan v1

Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ

AM: 1059656 Έτος: 7ο

Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ

AM: 1053363 Έτος: 6ο

Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΗ

AM: 1070954 Έτος: 60

Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ

AM: 1072569 Έτος: 5ο

Project manager : Ιωάννης Ζάχος

Quality manager:Μαρία Ανδρή

Σχετικά με την κατανομή προσπάθειας η προσπάθεια όλων των μελών της ομάδας ήταν ισοδύναμη.

Ιδανικά θέλουμε τα άτομα στη θέση του Quality manager να αλλάζουν σε κάθε παραδοτέο ώστε να περάσουν όλα τα μέλη της ομάδας από αυτή τη θέση. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ο ισομοιρασμός δουλειάς ανά παραδοτέο. Επιπλέον όλα τα μέλη θα έχουν γνώση για το περιεχόμενο όλων των τεχνικών κειμένων όλων των παραδοτέων.


Αρχικά η ομάδα μας έχοντας μελετήσει τις δύο μεθόδους που διδάχτηκαν στο μάθημα αποφασίσαμε δουλέψουμε με μια δική μας μέθοδο, η οποία συνδυάζει στοιχεία από τις δύο μεθόδους Kanban, Scrum. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα της Kamban με τον πίνακα για να κρατήσουμε όλα τα υποέργα του project,καταγράφοντας σε μια λίστα to do ότι χρειάζεται να γίνει. Σε μία άλλη λίστα ότι η οποία ονομάστηκε today, μετακινούσαμε το υποέργο που είχαμε συμφωνήσει να δουλέψουμε κατά την διάρκεια του meeting μας. Αφότου είχαμε τελειώσει με το Meeting μετακινούσαμε τα έργα που είχαμε ξεκινήσει στην επόμενη λίστα του πίνακα in progress. Τα υποέργα τα αφήναμε σε αυτή την λίστα μέχρι να αποφασίσουμε ότι είναι έτοιμα για παράδοση και να τα μετακινήσουμε στην λίστα done. Η πέντε λίστες του πίνακα Kamban που φτιάξαμε ολοκληρώνονται με αυτή της blocked στην οποία μετακινούσαμε το υποέργο που χρειαζόμασταν κάποιο feedback για να το συνεχίσουμε.


Όσο αφορά την συμβολή της μεθόδου Scrum στον τρόπο που δουλέψαμε. Αποφασίσαμε να χωρίσουμε τα παραδοτέα σε sprint δηλαδή το πρώτο μας sprint είναι το πρώτο παραδοτέο. Σκεφτήκαμε ότι αυτό θα μας βοηθούσε να οργανώσουμε με λεπτομέρεια την δουλειά που έχουμε για κάθε παράδοση. Όποτε στο sprint Backlog στοχοθετήσαμε τι χρειαζόταν να γίνει ανά


διαστήματα 2 εβδομάδων για το sprint 1 αναφέροντας πότε χρειάζεται να ολοκληρωθούν.

Η ομάδα μας αποφάσισε από την αρχή να κάνουμε Meeting τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα γιανα εργαζόμαστε πάνω στο project. Τα Meeting γινόντουσαν μέσω zoom και για όλη την οργάνωση αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το discord . Έχουμε χρησιμοποιήσει το github για να ανεβάζουμε τα ολοκληρωμένα μας και να δουλέψουμε το κώδικα. Επιπλέον για τη δημιουργια των pert charts χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή Edrawmax ενώ για τα gantt charts χρησιμοποιήσαμε το microsoft excel. Τέλος, δημιουργήσαμε τα mockups με το drawio. Για τον κώδικα χρησιμοποιήσαμε το περιβάλλον android studio και το eclipse. Τέλος, για την βάση χρησιμοποιήσαμε το mySQL workbench.

Pert chart

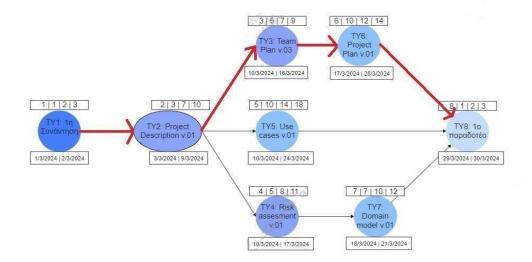

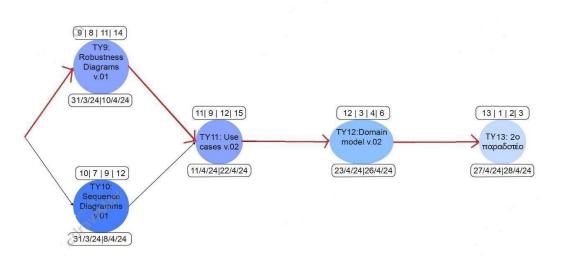

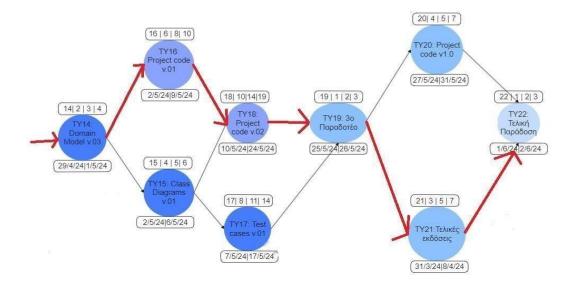

Κρίσιμο μονοπάτι team plan:

Κρίσιμο μονοπάτι 1:

M1:TY1-TY2-TY3-TY6-TY8-TY9-TY11-TY12-TY13-TY14-TY16-TY18-TY19-TY20-TY22

Κρίσιμο μονοπάτι 2:

M2:TY1-TY2-TY3-TY6-TY8-TY9-TY11-TY12-TY13-TY14-TY16-TY18-TY19-TY21-TY22

Και τα δύο μονοπάτι χρειάζονται 93 ημέρες.

Με βάση την διακύμανση το κρίσιμο μονοπάτι του team plan είναι το M2

var(1)=8.11111109

var(2)=8.30555553

Gant Chart

Tasks	Start Date	Days to complete											
ΤΥ1: 1η συνάντηση	3/1/2024	2		3/1/2024	3/11/2024	3/21/2024	3/31/2024	4/10/2024	4/20/2024	4/30/2024	5/10/2024	5/20/2024	5/30/2024
TY2: Project Description v.01	3/3/2024	7	ΤΥ1: 1η συνάντησ	n 🛑									
TY3: Team Plan v.01	3/10/2024	7	TY2; Project Description v.0:		3								
TY4: Risk assesment v.01	3/10/2024	8	TY3: Team Plan v.0	1	_	1							
TY5: Use cases v.01	3/10/2024	14	TY4: Risk assesment v.0	1									
TY6: Project Plan v.01	3/17/2024	12	TY5: Use cases v.0	2 4	-	- 1							
TY7: Domain Model v.01	3/18/2024	10	TY6: Project Plan v.0										
ΤΥ8: 1ο παραδοτέο	3/29/2024	2	TY7: Domain Model v.0:	5									
TY9: Robustness Diagrams v.01	3/31/2024	11	TY8: 1ο παραδοτέ TY9: Robustness Diagrams v.0	9 (4									
TY10: Sequence Diagrams v.01	3/31/2024	9	TY10: Sequence Diagrams v.0:	15									
TY11: Use cases v.02	4/11/2024	12	TY11: Use cases v.0:		- 1	- 85							
TY12: Domain Model v.02	4/23/2024	4	TY12: Domain Model v.0:		_	- 10	- 170	- 44					
ΤΥ13: 2ο παραδοτέο	4/27/2024	2	ΤΥ13: 2ο παραδοτέ			-				100			
TY14: Domain Model v.03	4/29/2024	3	TY14: Domain Model v.0.	3			-						
TY15: Class Diagrams v.01	5/2/2024	5	TY15: Class Diagrams v.0	1	-	-			-	- 8	3		
TY16: Project code v.01	5/2/2024	8	TY16: Project code v.0	33									
TY17: Test cases v.01	5/7/2024	11	TY17: Test cases v.0										
TY18: Project code v.02	5/10/2024	14	TY18: Project code v.0: TY19: 3ο παραδοτέ										_
ΤΥ19: 3ο παραδοτέο	5/25/2024	2	TY20: Project code v1.										
TY20: Project code v1.0	5/27/2024	5	ΤΥ21: Τελικές εκδόσει				10/0	_	-				
ΤΥ21: Τελικές εκδόσεις	5/27/2024	5	ΤΥ22: Τελικό παραδοτέ		- 0			-			_	_	
ΤΥ22: Τελικό παραδοτέο	6/1/2024	2	100									0 -	28
